Замечания и запросы заказчика к РД 291 (КЖ0, КД1–КД5)

Объект: индивидуальный жилой дом «Ромарио», посёлок «Берта», г. о. Истра, уч. 1. Договор подряда № 26/10-06/1. Кому: ООО «Строй Хауз», ГИП. Основание: эскизы заказчика БР-ЗК, БР-ОВ, БР-ОВК, БР-ВК от 18.10.2026. Формат ответа: пункт — решение — лист — срок.

1. Замечания и запросы

№	Пункт	Решение / запрос	Лист	Срок
1	Назначение закладной «Ввод ТТ ПЭ Ø315» у 13/Б	Подтвердить назначение; если резерв — заменить или дополнить гильзой Ø110 у котельной	КЖ0 л. 4	05.11.2026
2	Закладные плиты по ведомости заказчика БР-ЗК (31–322)	Внести в КЖ0: 3 × Ø160, 4 × Ø110, 12 × Ø50; гильзы ПНД SDR17, выпуск +300 мм, заглушки	КЖ0	05.11.2026
3	Заземление	Выпуски полосы 40×4 от арматуры свай 320 (≈ 11/Б) и 321 (≈ 13/В–Г) к ГЗШ и наружному контуру — подтвердить узел	КЖ0	05.11.2026
4	Основание под буфер 1000 л (≈ 1,1 т) и бойлер 500 л (≈ 0,72 т), до 1,7 т/м²	Дать узел усиления плиты 250 мм в углу котельной 11/Д (322)	КЖ0	05.11.2026
5	Пирог пола 1 этажа: трапы, приямки конвекторов, стяжка с тёплым полом	Узлы трапов (≥ 120 мм над плитой) и приямков 90–110 мм в стяжке по XPS	КЖ0	15.11.2026
6	Проходки в брусе П1–П8 (ПЕ1, газ, решётка камина, поливочные краны, гильзы Ø25)	Типовой узел проходок и электроканалов в клеёном брусе; условия сверловки на площадке	КД1	15.11.2026
7	Отверстия под электропроводку	Точки — по карте дизайнера к 13.11; привязка к середине венца и чистому полу	КД1	13.11.2026
8	Проёмы О1–О13 в перекрытии под короба, дымоходы и стояки	Обрамление проёмов; марка двутавров и таблица допустимых отверстий	КД4	11.01.2027
9	Люк на чердак	Не менее 800×1200 мм, утеплённый (оборудование вентиляции на тёплом чердаке); высота в коньке	КД4/КД5	11.01.2027
10	Выходы на кровлю К1–К12 (вентиляция, дымоходы, стояки, мачта)	Проходные элементы для фальца — заказать вместе с кровлей; проход между стропилами Ø ≤ 250 без подрезки	КД5	11.01.2027
11	Снегозадержание и ендовы	Двойной фальц или уплотнительная лента в ендовах	КД5	до заказа кровли
12	Огнезащита котельной (твердотопливный котёл в деревянном доме)	Негорючая облицовка стен и потолка, дверь EI 30 — показать в АР	АР	до перегородок
13	Ведомость заполнения проёмов	Передать (нужна для тендера окон)	АР	31.10.2026
14	Каркасные перегородки КД6	Передать	КД6	15.11.2026
15	Протокол теплопроводности клеёного бруса (условия Б)	Передать	КД1	15.11.2026
16	Север на планах этажей	Показать стрелку на листах планов	АР	при выпуске
17	Изменения по второй партии бруса (поставка 15.12) и по КД4	Сообщить крайнюю дату	КД1/КД4	01.11.2026

№	Пункт	Решение / запрос	Лист	Срок
18	Основание под камин у оси 7 (в РПЗ КЖ0 нагрузки от камина нет)	Тип камина — заказчик до 10.11. Если кирпичный (≈ 5–6 т): сваи или утолщение плиты под камин в КЖ0 до бетонирования плиты; проходки дымохода через КД4/КД5 со скользящим узлом	КЖ0	до бетонирования плиты

2. Иллюстрации

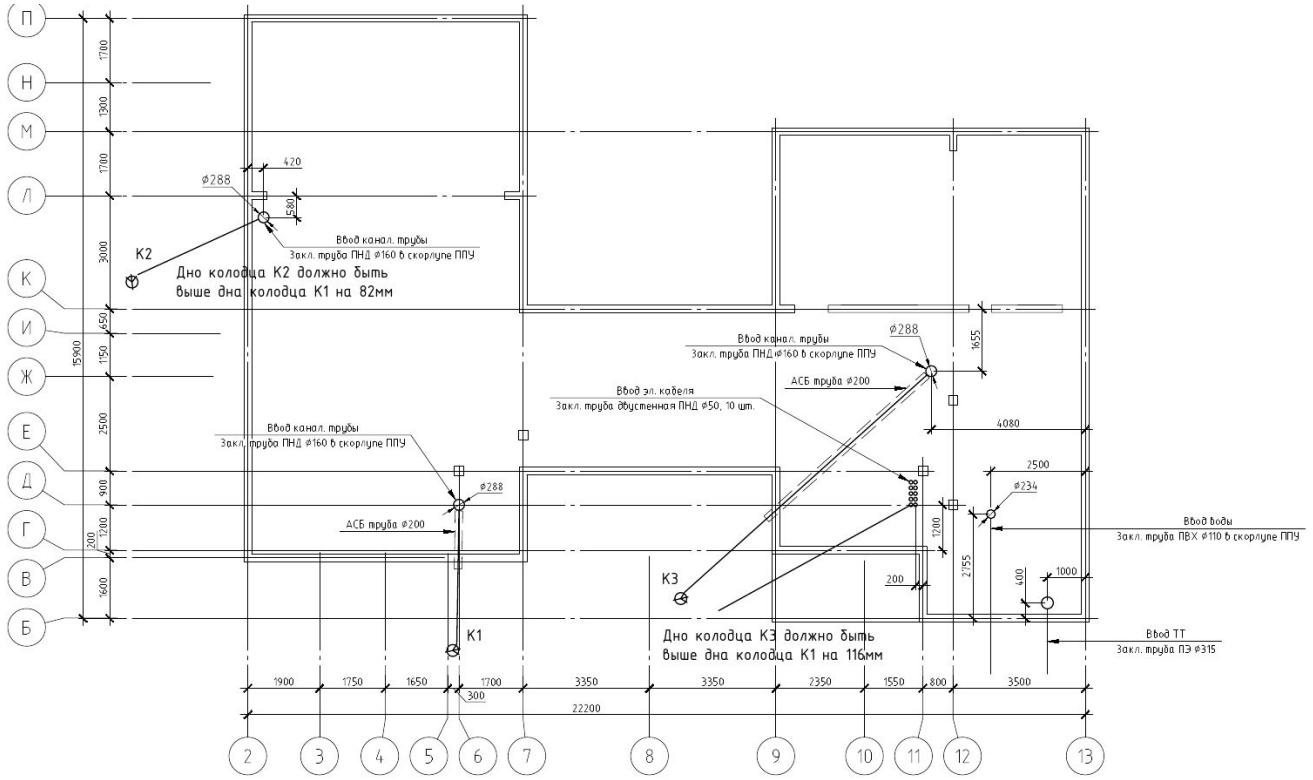


Рис. 1. КЖ0, план закладных: выпуски К1–К3, ввод воды, кабельные гильзы, ввод «ТТ» Ø315 (п. 1, 2).

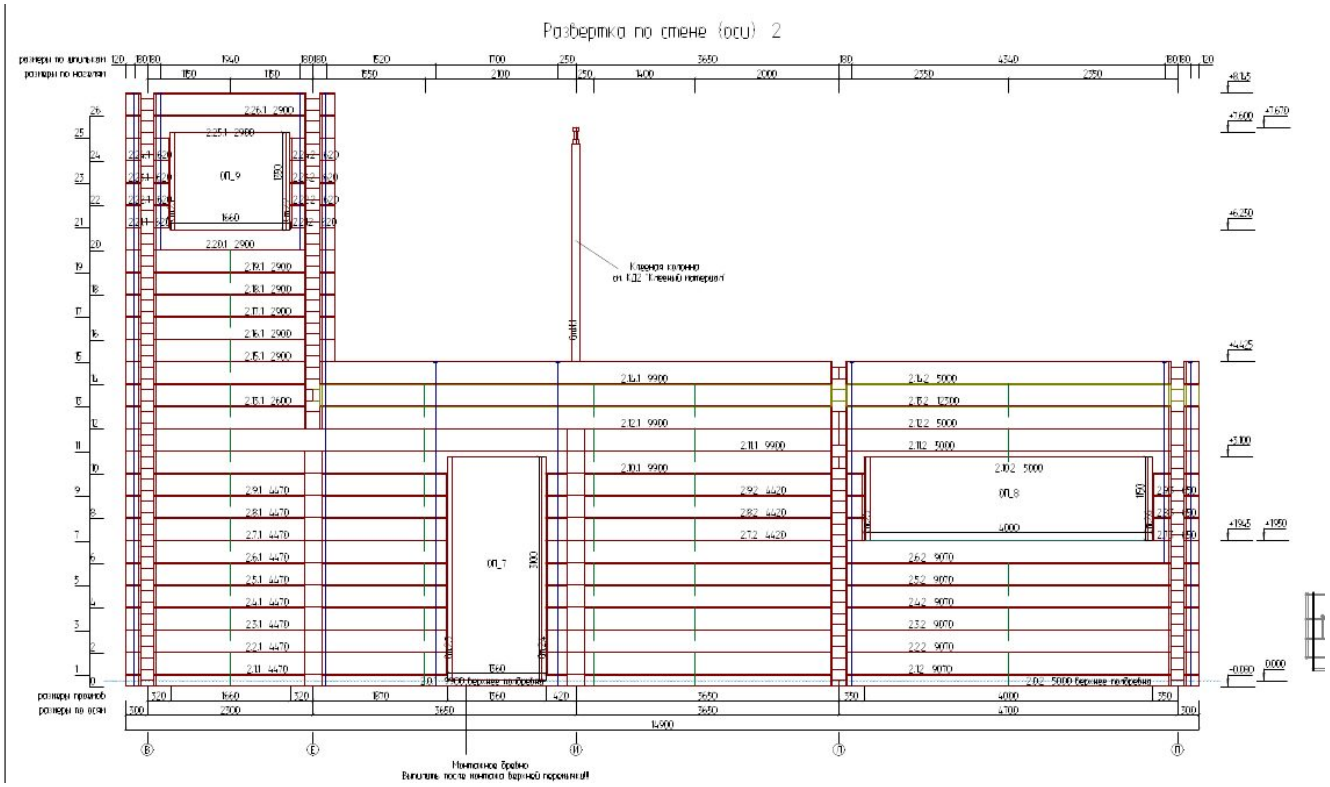


Рис. 2. КД1, развёртка по оси 2: проходки и электроканалы (п. 6, 7).

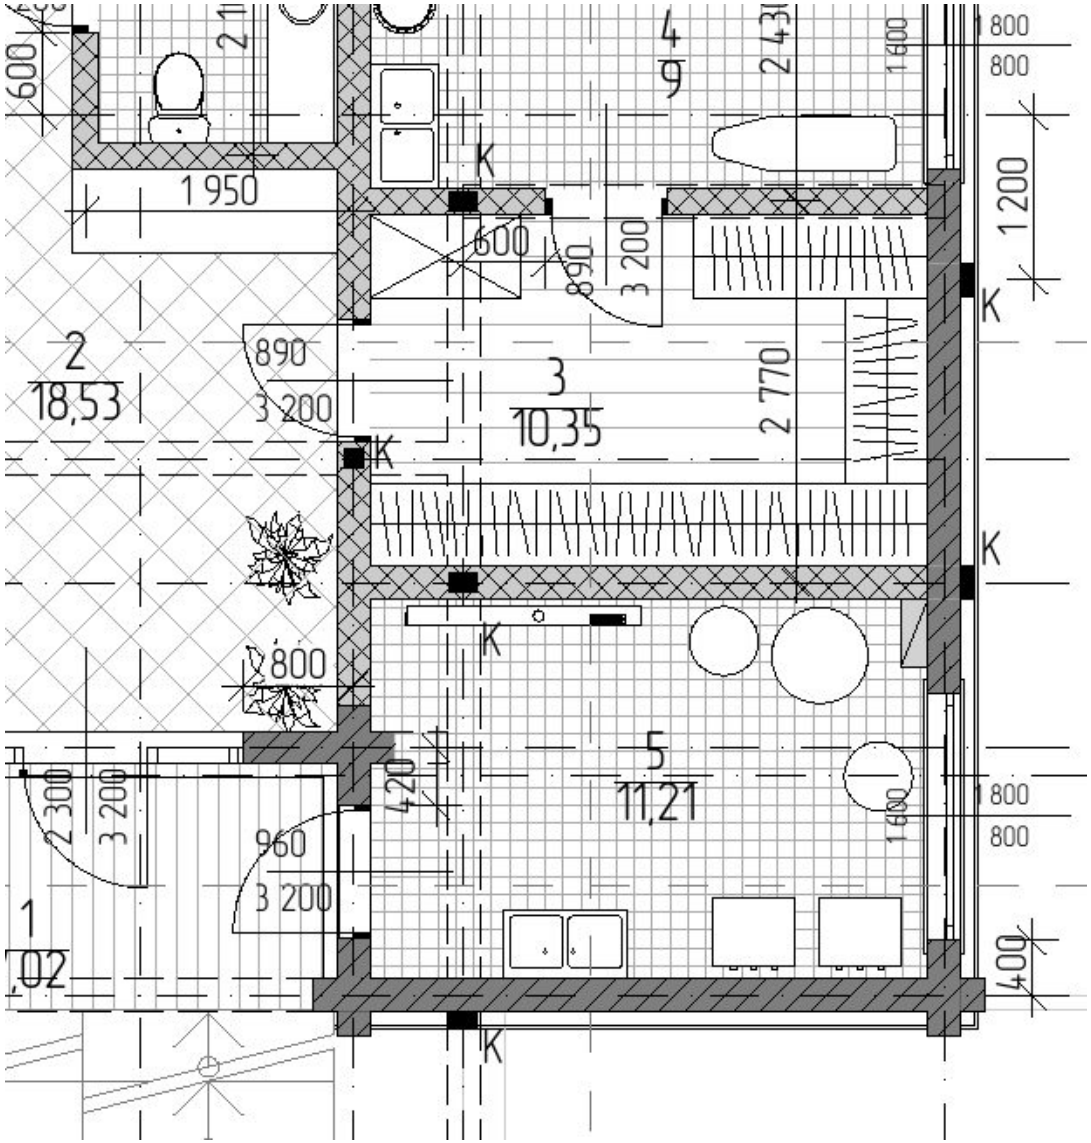


Рис. 3. АПР, котельная 11,21 м² (п. 4, 12).

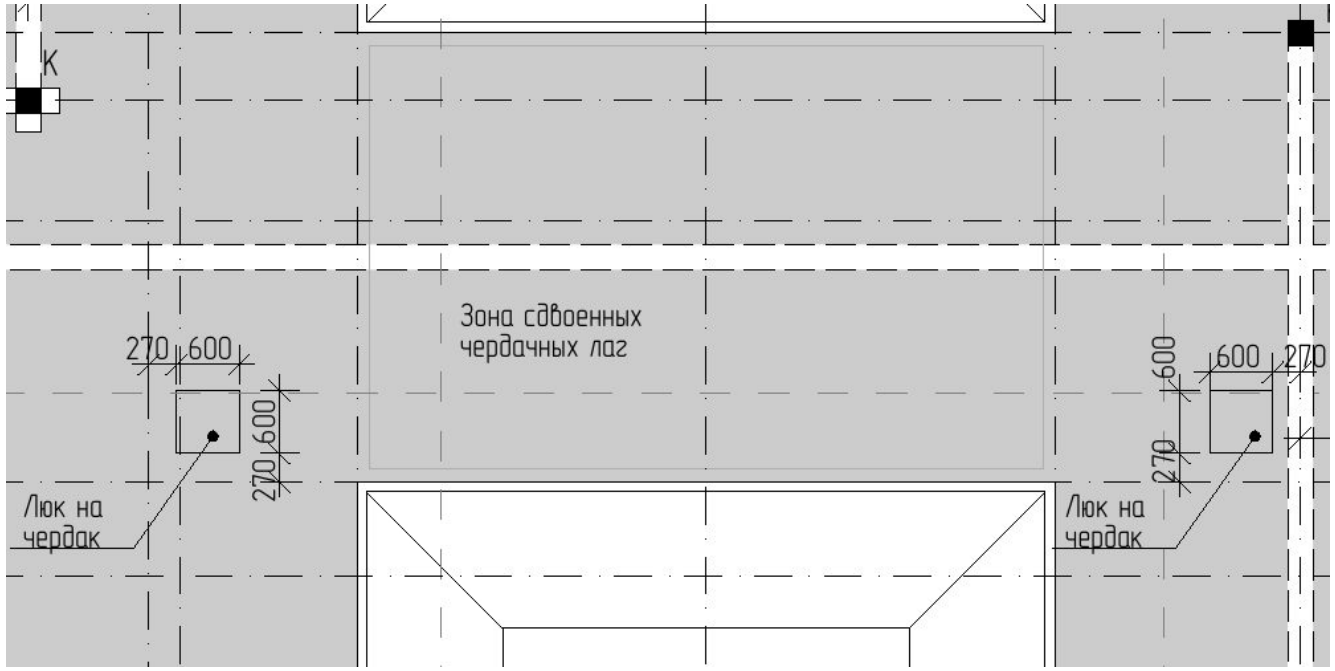


Рис. 4. АПР, план чердака: люки 600×600 мм (п. 9).

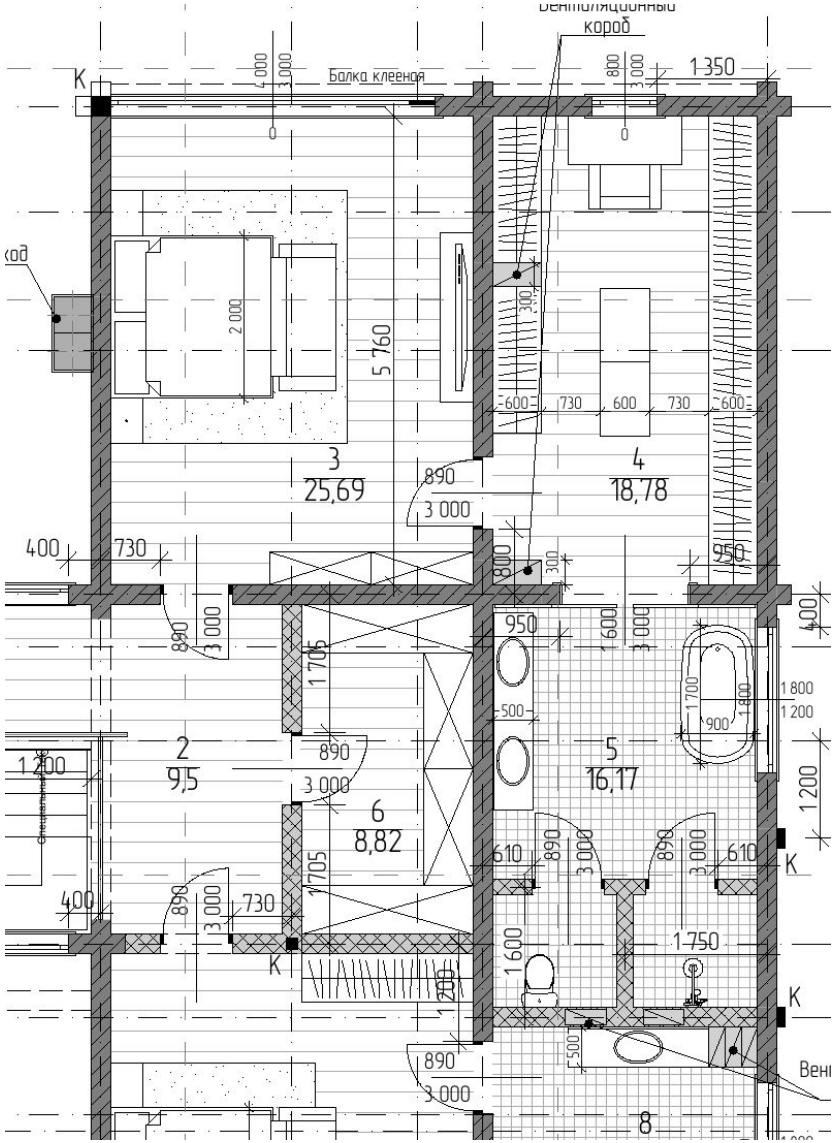


Рис. 5. АПР, 2 этаж: вентиляционные короба, проёмы в КД4 (п. 8).

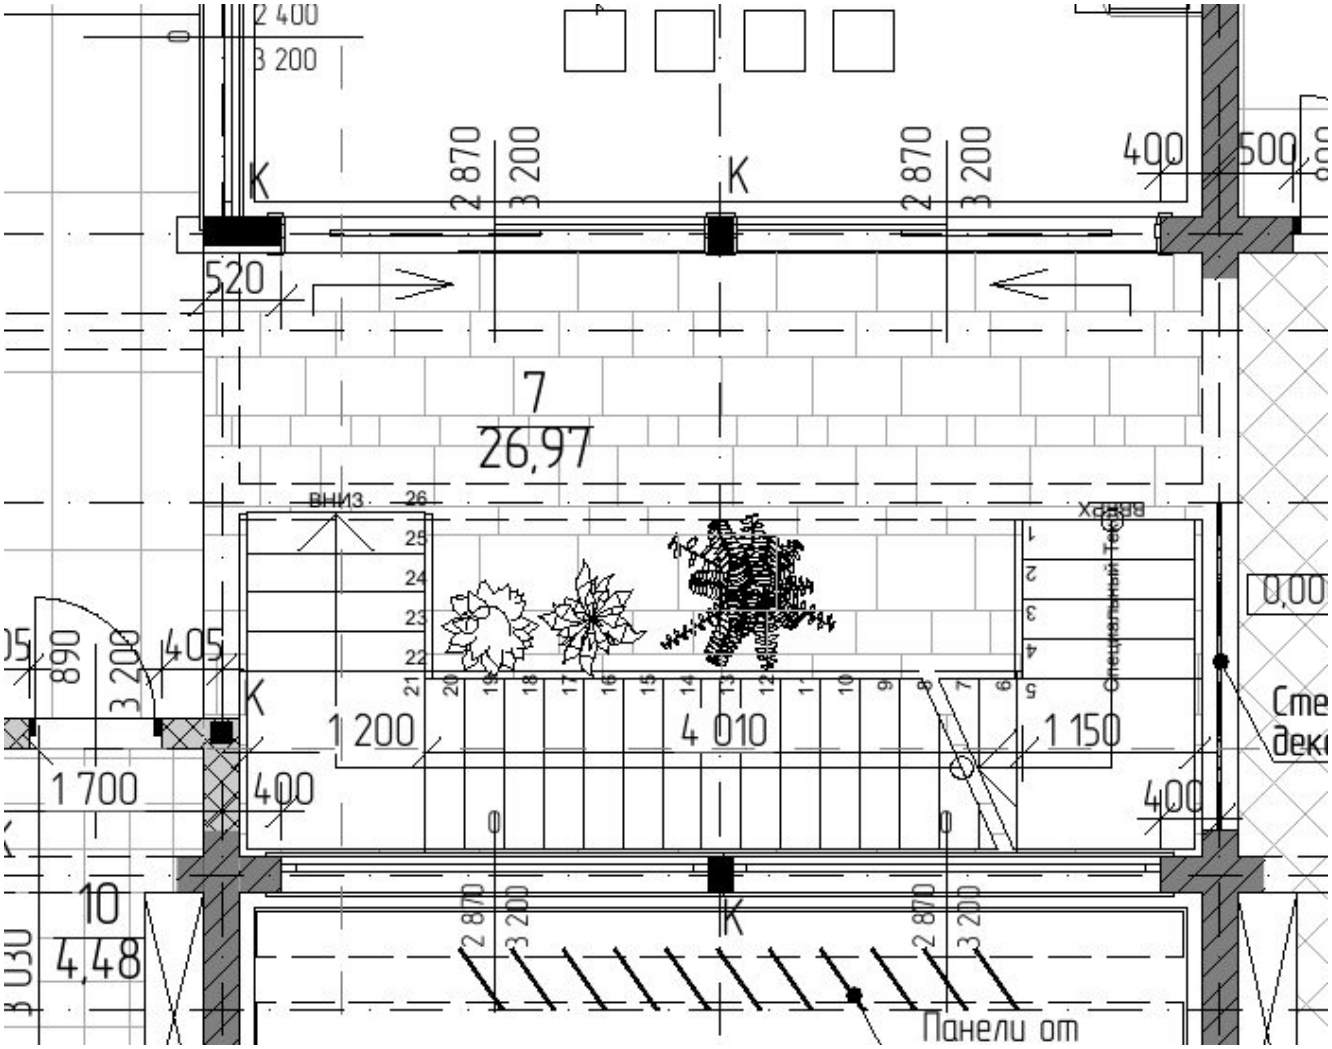


Рис. 6. АПР, холл со вторым светом: витражи 6,1–6,7×3,2 м (п. 13).

3. Примечания

Прочностные расчёты свай, плиты и деревянных конструкций заказчиком не проверялись; замечания касаются увязки РД с инженерными системами. Инженерные разделы выполняет проектировщик по тендеру (старт 16.11.2026), привязки уточняются им.
