291-ПОС. Организация строительства (упрощённая) и график

Индивидуальный жилой дом «Ромарио», посёлок «Берта», г. о. Истра, уч. 1. Концепт заказчика. Сроки — по договору подряда № 26/10-06/1 (Прил. 3) и решениям заказчика.

1. Общие сведения

• Объект: двухэтажный дом из клееного бруса 320×240, отапливаемая площадь 438 м²; 74 забивные сваи С40.20 + плита 250 мм; перекрытие по двутаврам 89×302 с ЦПС 60 мм; кровля — фальц.

• Сваи — с 12.10.2026, плита — до 25.12.2026, сборка коробки 18.01–14.03.2027, кровля — до 30.05, окончание работ Строй Хауз — 13.06.2027, заезд — 22.12.2027.

• Газ — не ранее 2028 (до границы посёлка — до 02.10.2028); первую зиму дом отапливается пеллетами и электрокотлом.

• Инженерию проектирует проектировщик по тендеру (старт 16.11.2026, проходки — 11.01.2027, полный комплект — 15.02.2027).

2. Организация строительной площадки

• Временное электроснабжение 15 кВт (щит Строй Хауз); энергия, вода, охрана и дизель для прогрева бетона — за заказчиком (по договору). Мощность на прогрев 65 м³ — вопрос СХ.

• Площадка складирования бруса под навесом на опорах ≥ 500 мм от земли, с проветриванием.

• Стройгенплан с проездом для копра, миксера и крана 25 т — до поставки бруса 19.10.

• Работы по участку (вертикальная планировка, подъезд, наружное освещение, ландшафт) — начинаются сейчас, по решению 17.10.

3. Последовательность и методы работ

1. Нулевой цикл: забивка свай с контролем отказа и динамическими испытаниями; плита с закладными по ведомости БР-ЗК (22 позиции, передача СХ 05.11); зимнее бетонирование с противоморозными добавками, прогревом и контролем набора прочности (вместо фиксированного перерыва).

2. Коробка по договору: сборка, перекрытие, стропила, кровля, водосток. Защитное покрытие бруса снаружи — в течение 30 дней после сборки (условие гарантии, работа заказчика).

3. Окна: тендер до 20.11, производство 8–12 недель, монтаж после усадочного периода по КД1.

4. После закрытия контура: черновая инженерия, стяжка с тёплым полом 1 этажа, котельная; сушка с контролем влажности древесины и стяжки перед отделкой.

5. Отделка — не менее 5 месяцев, планируется обратным ходом от заезда 22.12.2027.

6. Газ (2028): проект ГСВ, газовый котёл на существующий буфер, пеллетный котёл — в резерв.

4. Потребность в основных машинах и ресурсах

Машина / ресурс	Этап	Кол-во / срок
Копёр (сваебойная установка)	Сваи	1 шт., ≈ 1–2 нед.
Автобетононасос, миксеры	Плита	≈ 65 м³ бетона В22,5
Прогрев бетона (провод ПНСВ, тепловые пушки)	Плита, зима	≈ 2–3 нед.
Автокран 25 т / манипулятор	Брус, стропила	≈ 10–15 смен
Леса рамные / вышка-тура	Коробка, фасад	≈ 300 м²
Бригады	Весь период	фундамент 4–5 чел., сборка 5–6 чел., кровля 4 чел., инженерия 2–4 чел. по разделам, отделка 4–8 чел.

5. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность

• Работы на высоте — с ограждениями и страховкой; монтаж бруса краном — по ППР крана, с назначенным стропальщиком.

• Пожарная безопасность на деревянном объекте: огневые работы — только с допуском, первичные средства пожаротушения на каждом этаже, курение — вне объекта, временная электропроводка — с УЗО.

• Отходы бруса и упаковка — вывоз по договору; бетонные остатки не сливать на участке.


6. Контроль качества

• Технический надзор заказчика на ключевых этапах: сваи (отказ), армирование плиты, закладные, монтаж бруса, кровля, скрытые работы инженерии.

• Акты освидетельствования скрытых работ: армирование, гидро- и теплоизоляция, закладные, контур заземления, опрессовки тёплых полов и водопровода.

• Исполнительная документация и паспорта оборудования — в комплект к регистрации дома.

7. График строительства

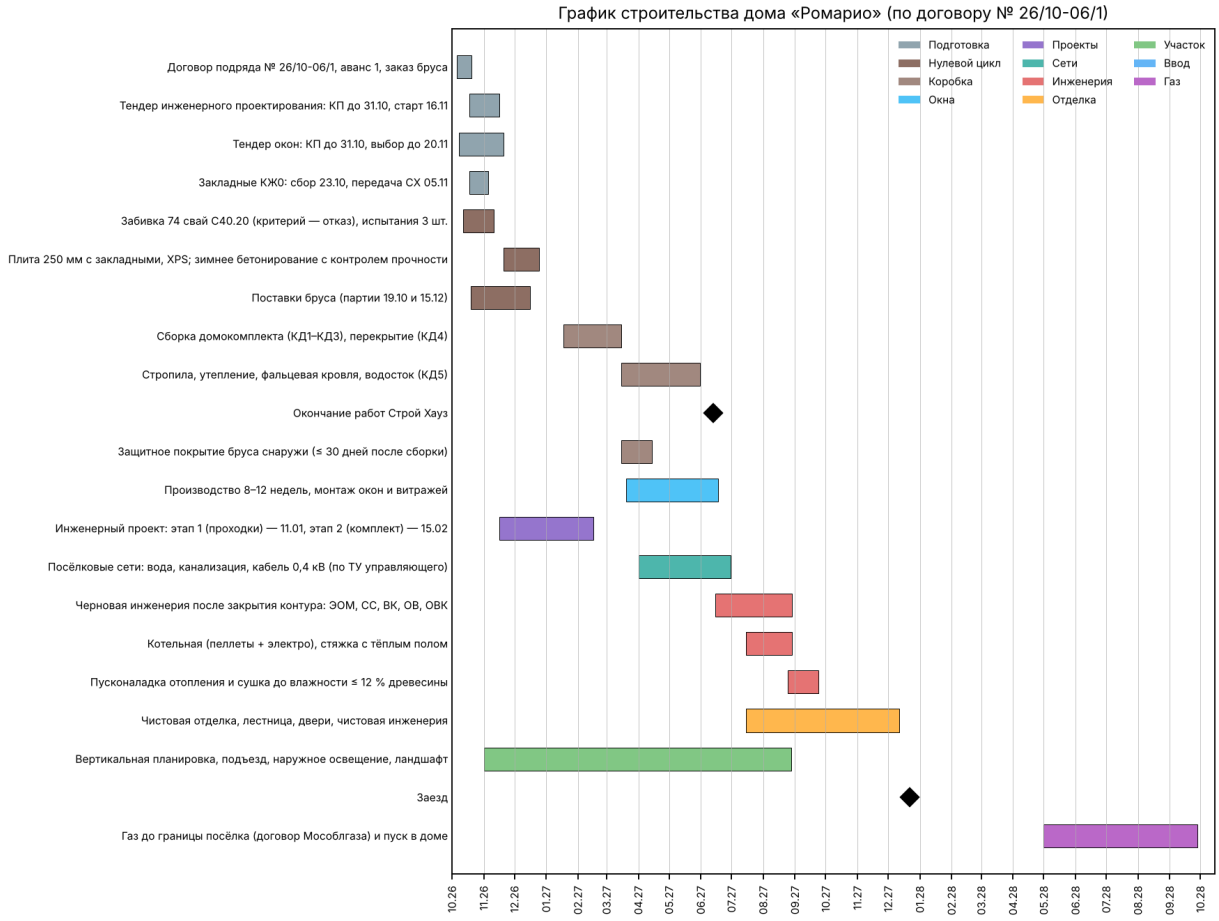

Этап	Работа	Начало	Окончание	Статус
Подготовка	Договор подряда № 26/10-06/1, аванс 1, заказ бруса	06.10.2026	19.10.2026	подписан
Подготовка	Тендер инженерного проектирования: КП до 31.10, старт 16.11	18.10.2026	15.11.2026	идёт
Подготовка	Тендер окон: КП до 31.10, выбор до 20.11	08.10.2026	19.11.2026	идёт
Подготовка	Закладные КЖ0: сбор 23.10, передача СХ 05.11	18.10.2026	04.11.2026	идёт
Нулевой цикл	Забивка 74 свай С40.20 (критерий — отказ), испытания 3 шт.	12.10.2026	10.11.2026	начато 12–14.10
Нулевой цикл	Плита 250 мм с закладными, XPS; зимнее бетонирование с контролем прочности	20.11.2026	24.12.2026	план

Этап	Работа	Начало	Окончание	Статус
Нулевой цикл	Поставки бруса (партии 19.10 и 15.12)	19.10.2026	15.12.2026	план
Коробка	Сборка домокомплекта (КД1–КД3), перекрытие (КД4)	18.01.2027	14.03.2027	договор
Коробка	Стропила, утепление, фальцевая кровля, водосток (КД5)	15.03.2027	30.05.2027	договор
Коробка	Окончание работ Строй Хауз	13.06.2027	13.06.2027	договор
Коробка	Защитное покрытие бруса снаружи (≤ 30 дней после сборки)	15.03.2027	13.04.2027	заказчик
Окна	Производство 8–12 недель, монтаж окон и витражей	20.03.2027	17.06.2027	план
Проекты	Инженерный проект: этап 1 (проходки) — 11.01, этап 2 (комплект) — 15.02	16.11.2026	15.02.2027	план
Сети	Посёлковые сети: вода, канализация, кабель 0,4 кВ (по ТУ управляющего)	01.04.2027	29.06.2027	нет ТУ
Инженерия	Черновая инженерия после закрытия контура: ЭОМ, СС, ВК, ОВ, ОВК	15.06.2027	28.08.2027	план
Инженерия	Котельная (пеллеты + электро), стяжка с тёплым полом	15.07.2027	28.08.2027	план
Инженерия	Пусконаладка отопления и сушка до влажности ≤ 12 % древесины	25.08.2027	23.09.2027	план
Отделка	Чистовая отделка, лестница, двери, чистовая инженерия	15.07.2027	11.12.2027	план
Участок	Вертикальная планировка, подъезд, наружное освещение, ландшафт	01.11.2026	27.08.2027	начать сейчас
Ввод	Заезд	22.12.2027	22.12.2027	цель
Газ	Газ до границы посёлка (договор Мособлгаза) и пуск в доме	01.05.2028	27.09.2028	2028

Статус на 21.10.2026. Сроки Строй Хауз — по договору; остальное — план заказчика.
