
БЭ-ПОС. Организация строительства и график

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

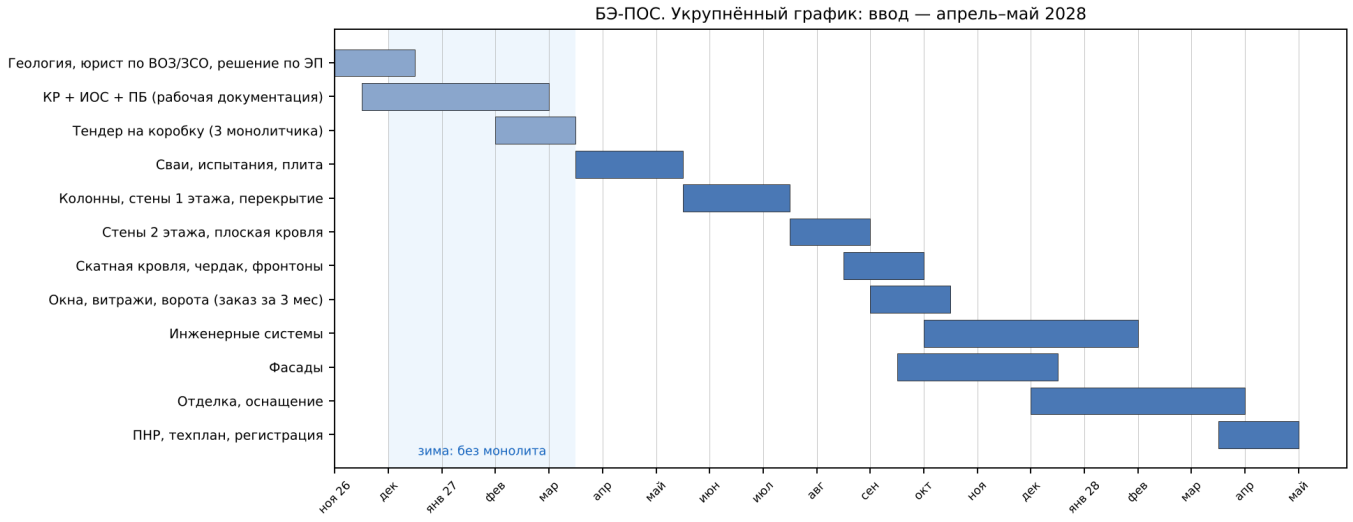

Ключевые условия графика

• Монолит (плита, перекрытие) — в тёплый сезон: апрель–август 2027. Зимнее бетонирование добавляет +10–15 % (≈ 0,7 млн) и риск качества у воды — в сценарии В не заложено.

• Сваи — только после заключения юриста по капитальности в 100-м зоне и ИГИ на пятне.

• Витражи, окна и ворота заказываются в мае 2027 (срок изготовления 8–12 недель) единым тендером с «Ромарио».

• Площадка, бытовки, подъезд — общие с посёлком (Строй Хауз выходит на дома с 12.10.2026, монтаж с 18.01.2027).

• Подрядчик коробки — тендер среди 3 монолитных подрядчиков по ВОР (БЭ-ТД), Строй Хауз — на общих условиях.

• Ввод в эксплуатацию — апрель–май 2028; при старте свай зимой 2026–27 (если право и ИГИ готовы) — осень 2027.
