291-ПОС. Проект организации строительства (упрощённый) и график

Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио». Состав по смыслу СП 48.13330.2019 в объёме, достаточном для ИЖС.

1. Общие сведения

• Объект: двухэтажный жилой дом из клееного бруса 240 мм, 488 м², фундамент — забивные сваи 200×200 L=4 м + ж/б плита 250 мм, кровля — фальцевая по стропилам.

• Начало работ — ноябрь 2026 г.; заезд — декабрь 2027 г.; газ — ≈ июнь 2028 г. (через 6 мес. после заезда). Продолжительность до заезда ≈ 13–14 мес.

• Ключевое условие сроков — заказ домокомплекта сразу после утверждения КД (производство 2,5–3 мес.) и монтаж коробки в феврале–апреле 2027 г.

2. Организация строительной площадки

• Въезд для техники: копёр (сваебой), автобетононасос/миксер, автокран 25 т или манипулятор 10–15 т для монтажа бруса и стропил. Подъезд — шириной ≥ 3,5 м, с временным покрытием (плиты/щебень).

• Площадка складирования бруса — под навесом на опорах ≥ 500 мм от земли (требование КД1), с проветриванием, без плёнки вплотную к брусу.

• Бытовка, биотуалет, контейнер для мусора, временное ограждение, освещение площадки.

• Временное электроснабжение 15 кВт (строительный щит с УЗО), вода — временный ввод/ёмкость.

• Посадку дома, места складирования и проезды уточнить по топосъёмке (стройгенплан — после её получения).

3. Последовательность и методы работ

1. Подготовительный период: ГПЗУ, топосъёмка, уведомление о строительстве, заявки на ТУ (электро ≥ 60 кВт с учётом электрокотла и кондиционирования), заказ домокомплекта.

2. Нулевой цикл: снятие растительного слоя ≥ 150 мм, геотекстиль, песок; забивка свай; плита с закладными под вводы и выпуски (КЖ0 л. 4) — проверить их привязку с 291-ВК до бетонирования; XPS под плитой и по периметру. Зимнее бетонирование — с противоморозными добавками и прогревом, укрытием; контроль прочности.

3. Коробка: подвенечный оклад, монтаж бруса на нагели и шпильки (КД1), перекрытия по двутавровым балкам (КД4), стропильная система и кровля (КД5). Брус в процессе монтажа защищать от осадков. Закладные гильзы в брусе под вентиляцию, дымоход, кабели — по 291-ОВК/ОВ/ВК до обшивки.

4. После закрытия контура: черновые инженерные системы, отверстия в двутавровых балках — только в разрешённых зонах (согласовать с КД4); стяжки с тёплым полом, сушка дома отоплением ≥ 2–3 недели до начала чистовой отделки.

5. Фасад: шлифовка, антисептирование и финишная покраска бруса в сухой период (t ≥ +5 °C), устройство отмостки после контура заземления.

6. Отделка и пусконаладка: тёплые полы и кондиционеры — пусконаладка с протоколами; вентиляция — замер расходов по 291-ОВК.

7. Газ (этап 2): проект ГСВ и подключение по договору с Мособлгазом; газовый котёл подключается к уже смонтированному буферу; пеллетный котёл остаётся резервом.

4. Потребность в основных машинах и ресурсах

Машина / ресурс	Этап	Кол-во / срок
Копёр (сваебойная установка)	Сваи	1 шт., ≈ 1–2 нед.
Автобетононасос, миксеры	Плита	≈ 65 м³ бетона В22,5
Прогрев бетона (провод ПНСВ, тепловые пушки)	Плита, зима	≈ 2–3 нед.
Автокран 25 т / манипулятор	Брус, стропила	≈ 10–15 смен

Машина / ресурс	Этап	Кол-во / срок
Леса рамные / вышка-тура	Коробка, фасад	≈ 300 м²
Бригады	Весь период	фундамент 4–5 чел., сборка 5–6 чел., кровля 4 чел., инженерия 2–4 чел. по разделам, отделка 4–8 чел.

5. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность

• Работы на высоте — с ограждениями и страховкой; монтаж бруса краном — по ППР крана, с назначенным стропальщиком.

• Пожарная безопасность на деревянном объекте: огневые работы — только с допуском, первичные средства пожаротушения на каждом этаже, курение — вне объекта, временная электропроводка — с УЗО.

• Отходы бруса и упаковка — вывоз по договору; бетонные остатки не сливать на участке.


6. Контроль качества

• Технический надзор заказчика на ключевых этапах: сваи (отказ), армирование плиты, закладные, монтаж бруса, кровля, скрытые работы инженерии.

• Акты освидетельствования скрытых работ: армирование, гидро- и теплоизоляция, закладные, контур заземления, опрессовки тёплых полов и водопровода.

• Исполнительная документация и паспорта оборудования — в комплект к регистрации дома.

7. График строительства

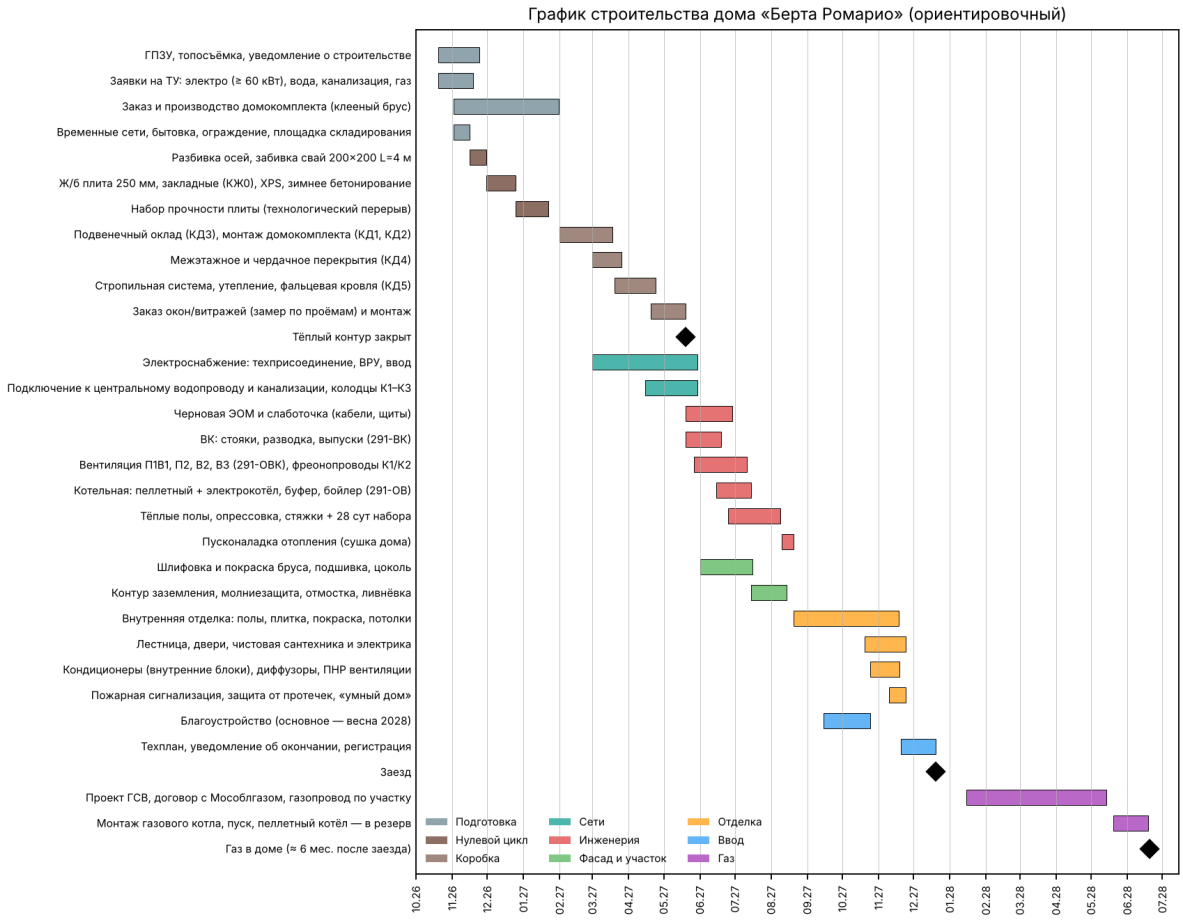

Этап	Работа	Начало	Окончание
Подготовка	ГПЗУ, топосъёмка, уведомление о строительстве	20.10.2026	23.11.2026
Подготовка	Заявки на ТУ: электро (≥ 60 кВт), вода, канализация, газ	20.10.2026	18.11.2026
Подготовка	Заказ и производство домокомплекта (клееный брус)	02.11.2026	30.01.2027

Этап	Работа	Начало	Окончание
Подготовка	Временные сети, бытовка, ограждение, площадка складирования	02.11.2026	15.11.2026
Нулевой цикл	Разбивка осей, забивка свай 200×200 L=4 м	16.11.2026	29.11.2026
Нулевой цикл	Ж/б плита 250 мм, закладные (КЖ0), XPS, зимнее бетонирование	30.11.2026	24.12.2026
Нулевой цикл	Набор прочности плиты (технологический перерыв)	25.12.2026	21.01.2027
Коробка	Подвенечный оклад (КД3), монтаж домокомплекта (КД1, КД2)	01.02.2027	17.03.2027
Коробка	Межэтажное и чердачное перекрытия (КД4)	01.03.2027	25.03.2027
Коробка	Стропильная система, утепление, фальцевая кровля (КД5)	20.03.2027	23.04.2027
Коробка	Заказ окон/витражей (замер по проёмам) и монтаж	20.04.2027	19.05.2027
Коробка	Тёплый контур закрыт	20.05.2027	20.05.2027
Сети	Электроснабжение: техприсоединение, ВРУ, ввод	01.03.2027	29.05.2027
Сети	Подключение к центральному водопроводу и канализации, колодцы К1–К3	15.04.2027	29.05.2027
Инженерия	Черновая ЭОМ и слаботочка (кабели, щиты)	20.05.2027	28.06.2027
Инженерия	ВК: стояки, разводка, выпуски (291-ВК)	20.05.2027	18.06.2027
Инженерия	Вентиляция П1В1, П2, В2, В3 (291-ОВК), фреонопроводы К1/К2	27.05.2027	10.07.2027
Инженерия	Котельная: пеллетный + электрокотёл, буфер, бойлер (291-ОВ)	15.06.2027	14.07.2027
Инженерия	Тёплые полы, опрессовка, стяжки + 28 сут набора	25.06.2027	08.08.2027
Инженерия	Пусконаладка отопления (сушка дома)	10.08.2027	19.08.2027
Фасад и участок	Шлифовка и покраска бруса, подшивка, цоколь	01.06.2027	15.07.2027
Фасад и участок	Контур заземления, молниезащита, отмостка, ливнёвка	15.07.2027	13.08.2027
Отделка	Внутренняя отделка: полы, плитка, покраска, потолки	20.08.2027	17.11.2027
Отделка	Лестница, двери, чистовая сантехника и электрика	20.10.2027	23.11.2027
Отделка	Кондиционеры (внутренние блоки), диффузоры, ПНР вентиляции	25.10.2027	18.11.2027
Отделка	Пожарная сигнализация, защита от протечек, «умный дом»	10.11.2027	23.11.2027
Ввод	Благоустройство (основное — весна 2028)	15.09.2027	24.10.2027
Ввод	Техплан, уведомление об окончании, регистрация	20.11.2027	19.12.2027
Ввод	Заезд	20.12.2027	20.12.2027
Газ	Проект ГСВ, договор с Мособлгазом, газопровод по участку	15.01.2028	13.05.2028
Газ	Монтаж газового котла, пуск, пеллетный котёл — в резерв	20.05.2028	18.06.2028
Газ	Газ в доме (≈ 6 мес. после заезда)	20.06.2028	20.06.2028

График ориентировочный: сроки сдвигаются по готовности домокомплекта, погоде, срокам техприсоединения сетей и поставки окон.
